


REALIZACJA PLANU REMONTÓW GZKN SZB W LATACH 2008-2012

rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plan	36 013 509,00 zł	11 927 500,05 zł	13 089 647,00 zł	9 590 700,00 zł	10 857 999,84 zł
Wykonanie wg. faktur	36 013 508,05 zł	11 885 326,74 zł	12 826 005,73 zł	9 587 742,63 zł	
Wykonanie w %	100,00%	99,65%	97,99%	99,97%	

ŚRODKI WYDANE NA REMONTY W LATACH 2008-2011 ORAZ PLANOWANE NA ROK 2012

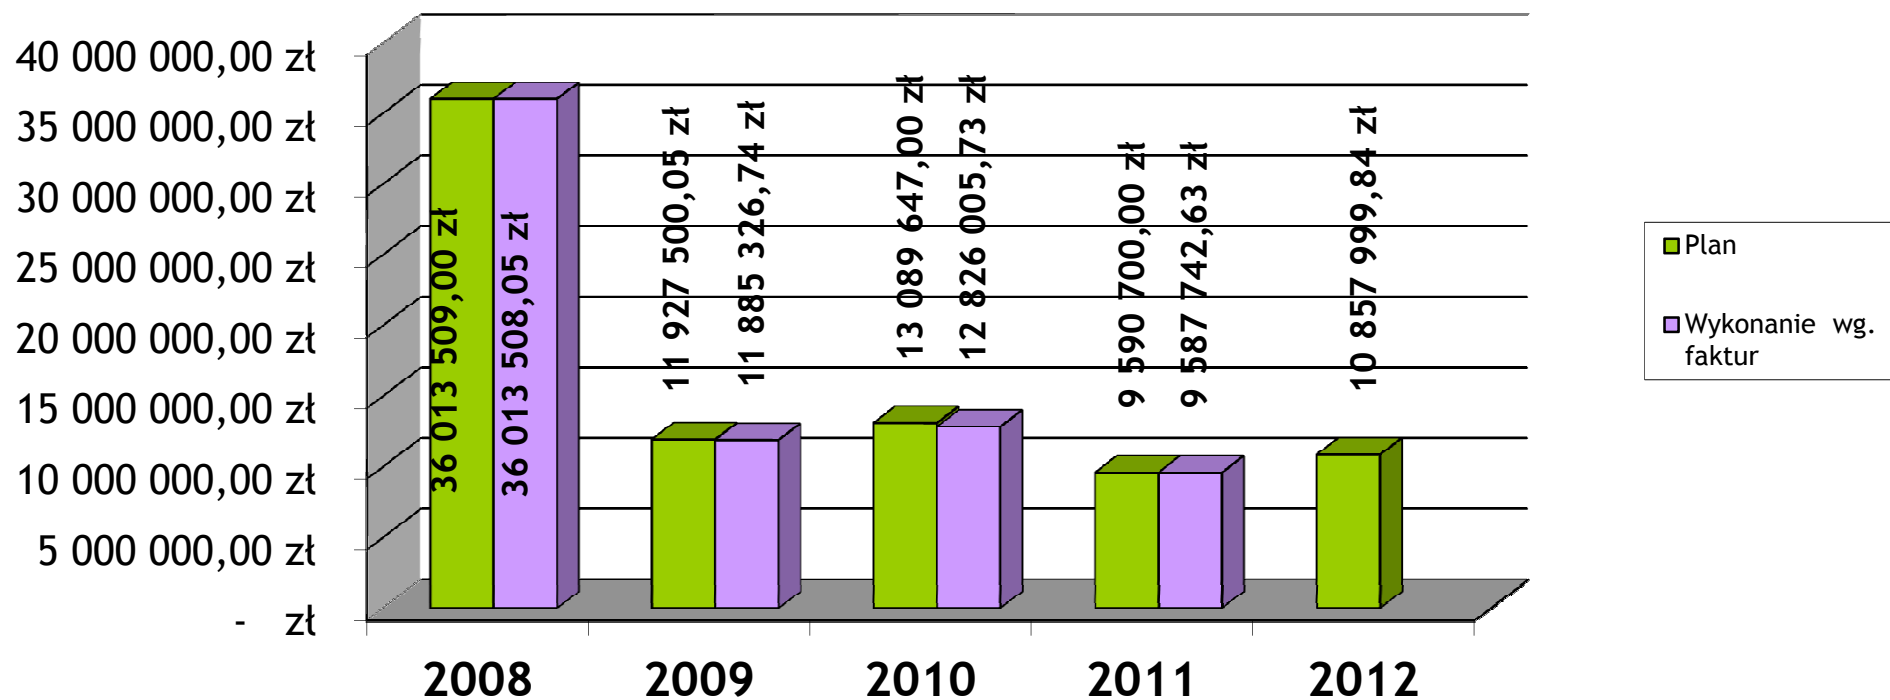


Sporządziła : Justyna Kleina - Daszkiewicz

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ROBOTY DEKARSKIE W LATACH 2008-2012

rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plan	2 938 748,16 zł	241 118,00 zł	269 715,00 zł	27 945,00 zł	185 000,00 zł
Wykonanie wg. faktur	2 938 748,16 zł	241 116,41 zł	262 601,93 zł	27 944,83 zł	
Wykonanie w %	100,00%	100,00%	97,36%	100,00%	


ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ROBOTY DEKARSKIE W LATACH 2008-2011 ORAZ PLANOWANE NA ROK 2012

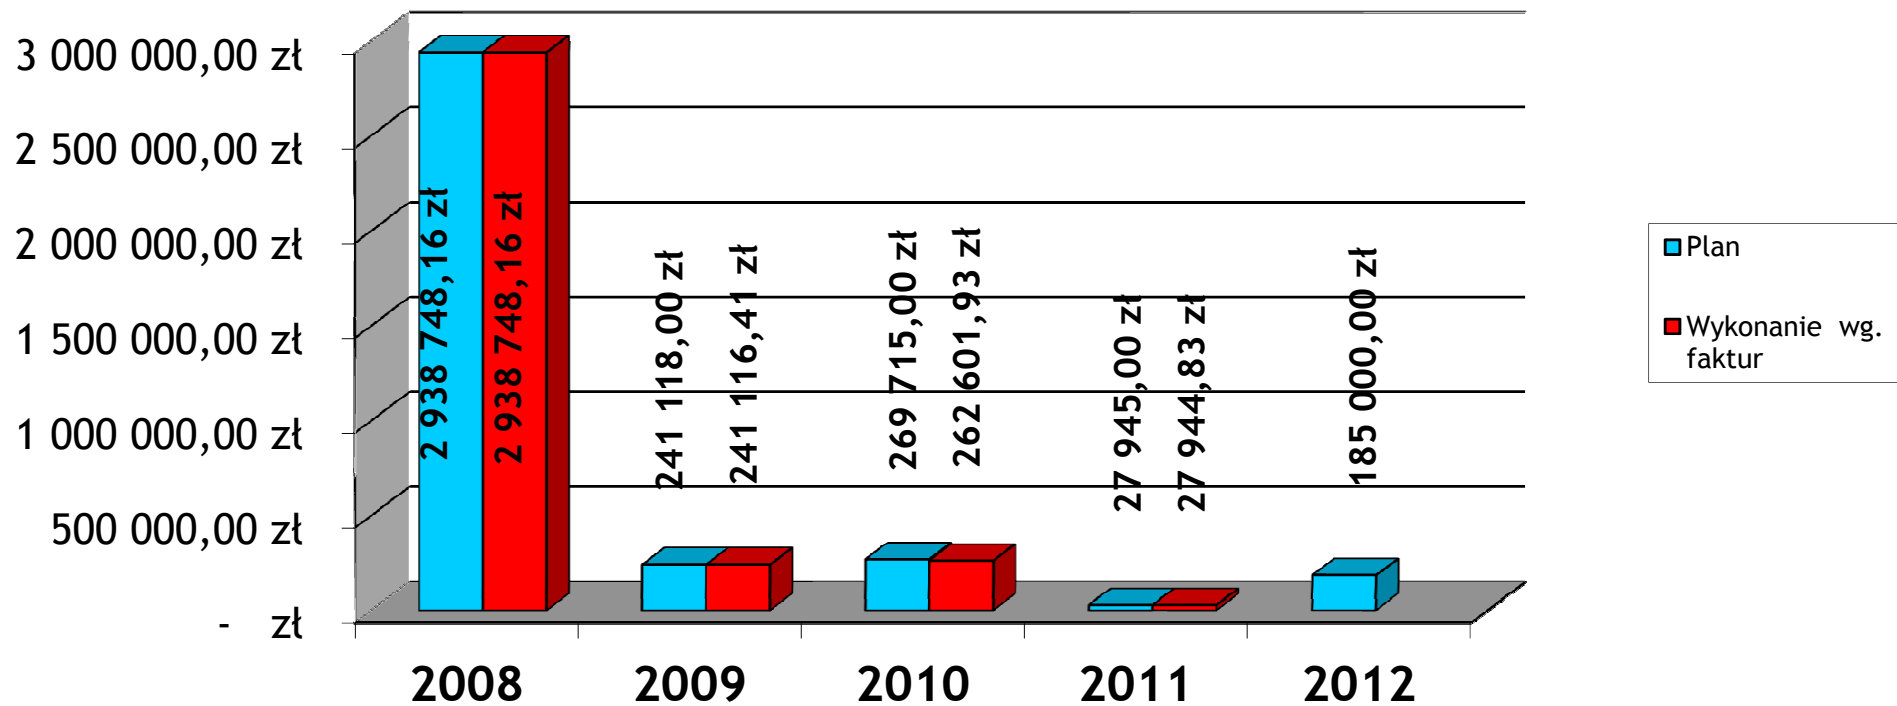

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W LATACH 2008-2012

rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plan	2 581 118,66 zł	607 238,64 zł	553 017,00 zł	530 107,00 zł	736 309,00 zł
Wykonanie wg. faktur	2 581 118,66 zł	598 691,19 zł	552 859,50 zł	530 074,94 zł	
Wykonanie w %	100,00%	98,59%	99,97%	99,99%	


ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W LATACH 2008-2011 ORAZ PLANOWANE NA ROK 2012

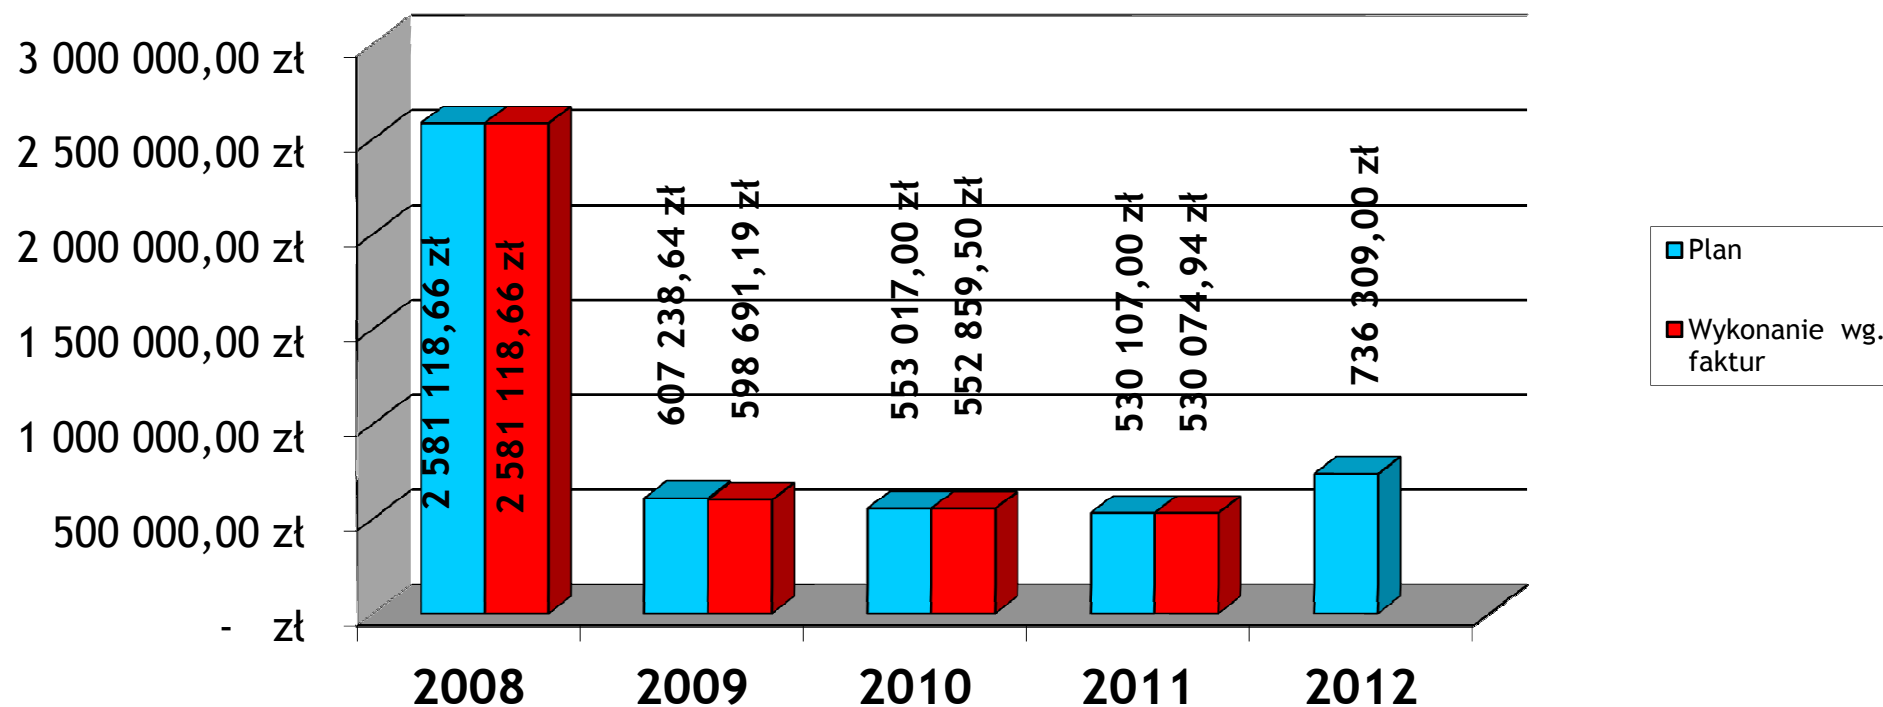

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE W LATACH 2008-2012

rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plan	1 269 552,36 zł	69 829,50 zł	82 959,00 zł	- zł	388 998,00 zł
Wykonanie wg. faktur	1 269 552,36 zł	69 828,80 zł	82 956,43 zł	- zł	
Wykonanie w %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE W LATACH 2008-2011 ORAZ PLANOWANE NA ROK 2012

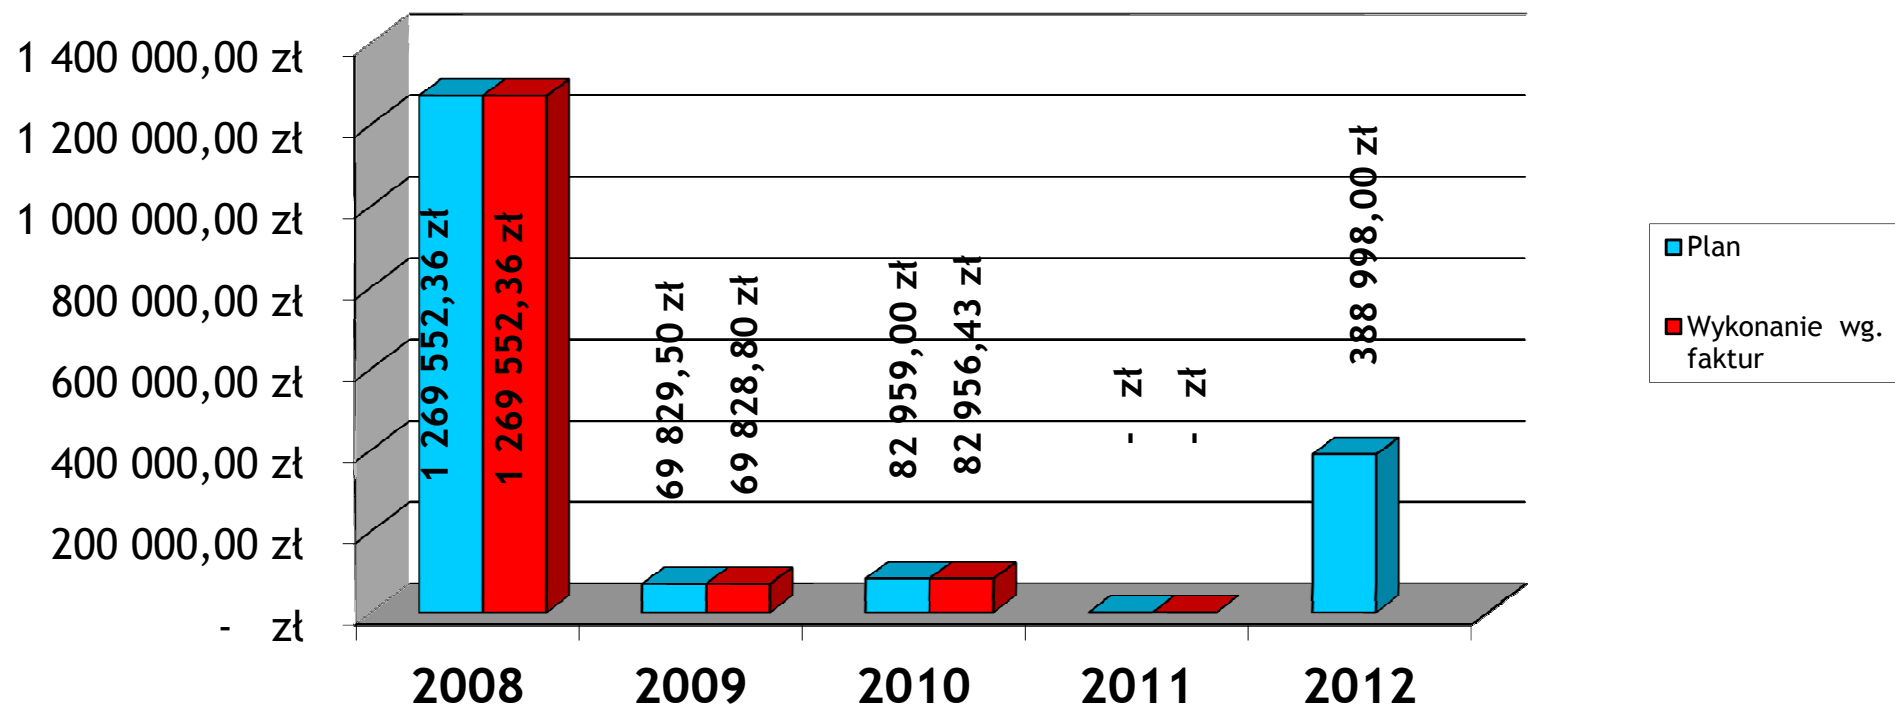

Sporządziła : Justyna Kleina - Daszkiewicz

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOCIEPLENIA BUDYNKÓW W LATACH 2008-2012

rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plan	677 978,58 zł	128 510,00 zł	33 052,00 zł	- zł	- zł
Wykonanie wg. faktur	677 978,58 zł	128 509,40 zł	33 051,45 zł	- zł	
Wykonanie w %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOCIEPLENIA BUDYNKÓW W LATACH 2008-2011 ORAZ PLANOWANE NA ROK 2012

